



PIRKIMŲ PRIEŽIŪRA



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Temos



- ▶ Projekto pirkimų planas
- ▶ Išankstinė pirkimo dokumentų patikra
- ▶ Įvykdytų pirkimų patikra

Teisės aktai




- ▶ Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT)
- ▶ Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ)
- ▶ VPĮ I skyriaus III skirsnyje nurodytus pirkimus reglamentuojantys teisės aktai
- ▶ Projektų finansavimo sąlygų aprašai (PFSA)




Projekto pirkimų planas (PPP)

Kodėl reikia PPP?

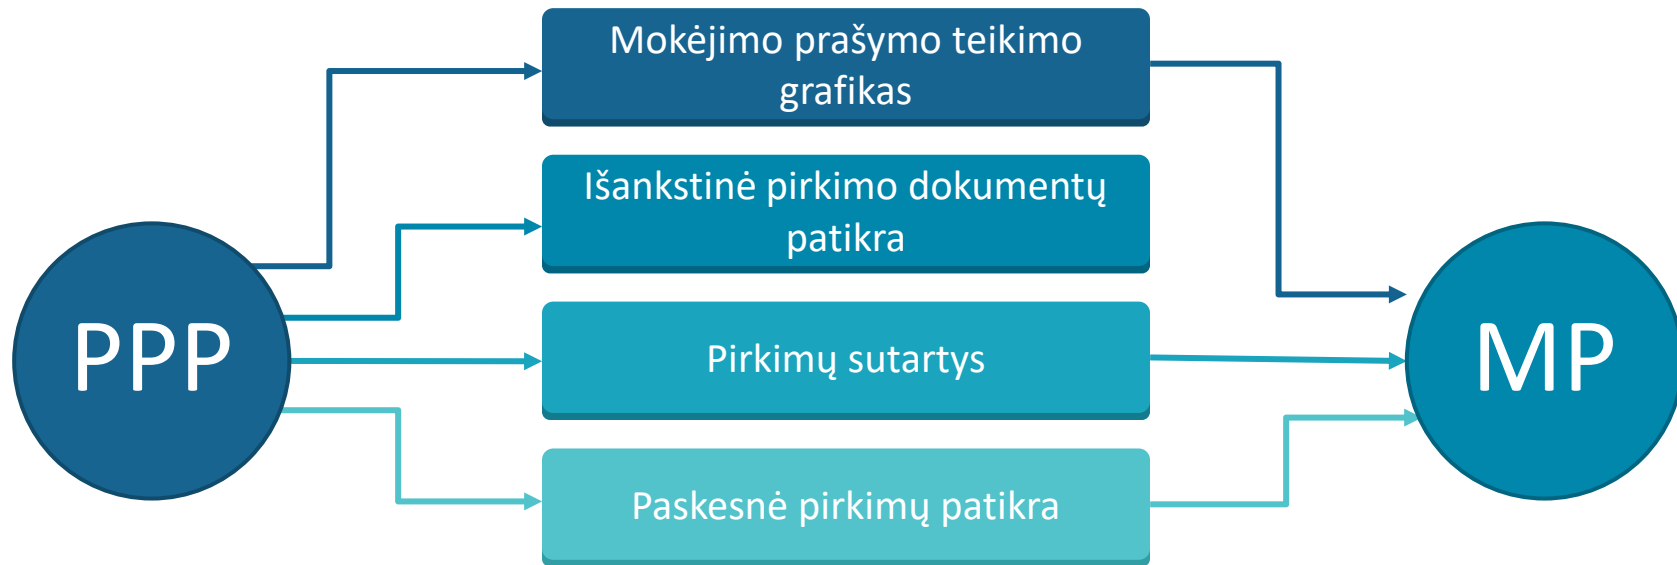


PPP teikimas ir vertinimas. PAFT 40 skirsnis

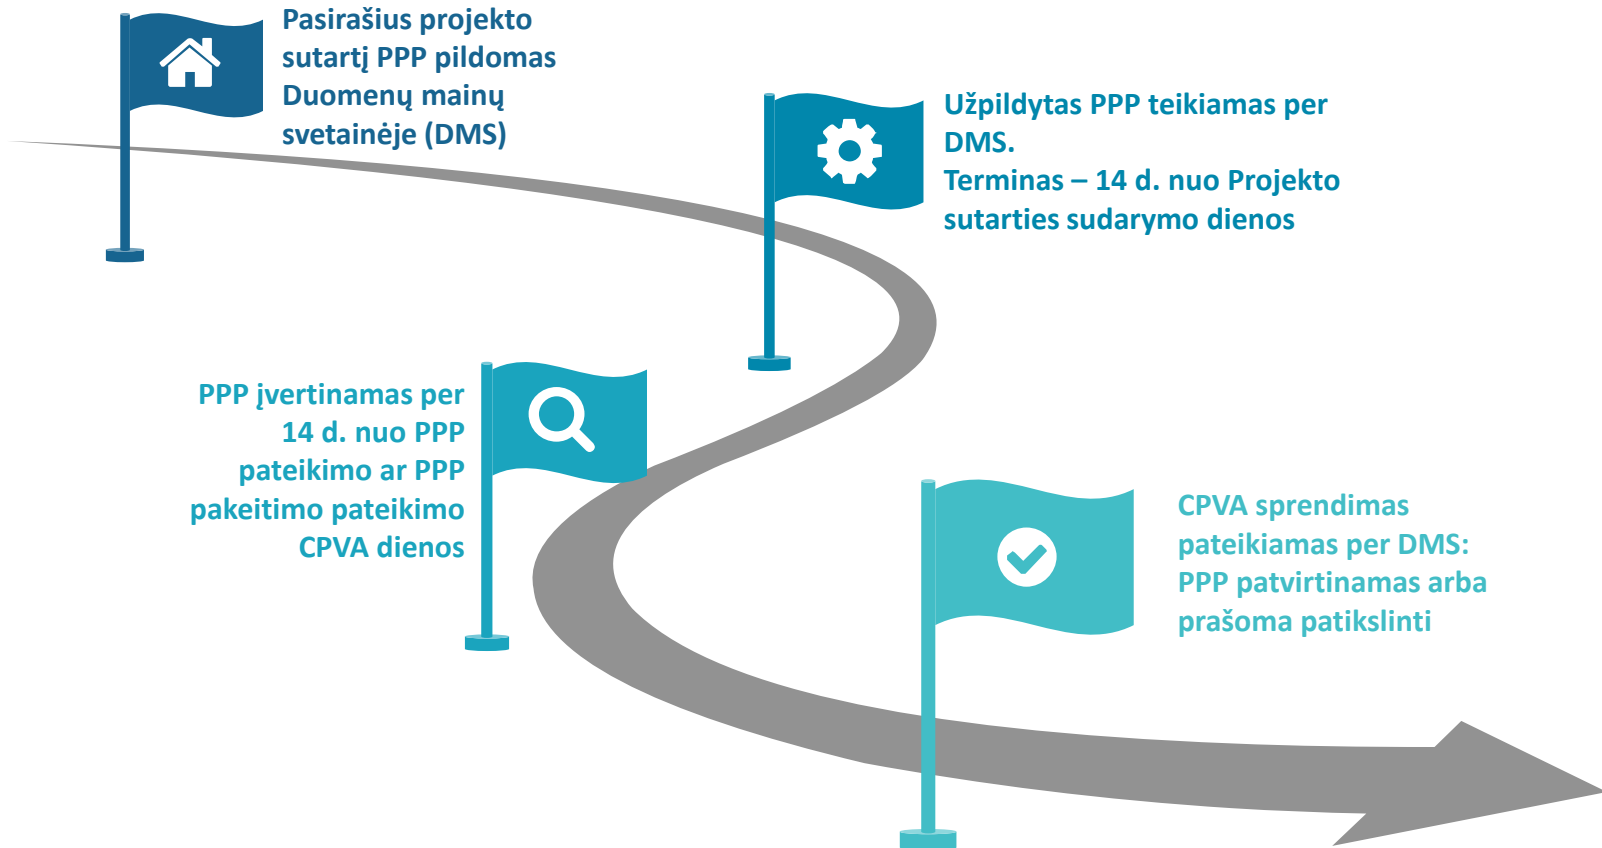

PPP pildymas. Pagrindiniai aspektai


Vienai pirkimo procedūrai –
viena PPP eilutė

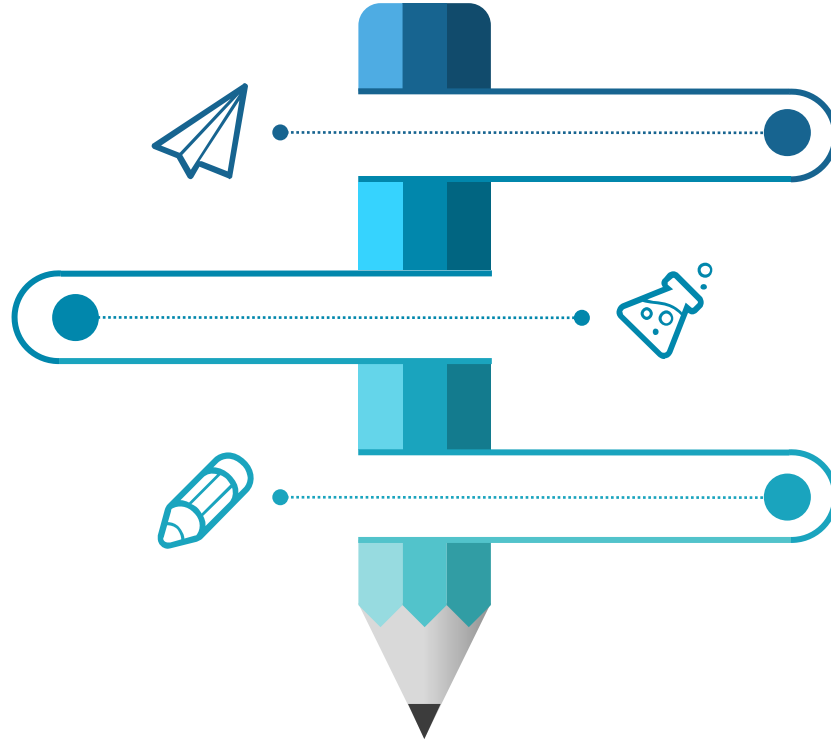

Nurodomi visi su projektu
susiję pirkimai ir kurių išlaidas
planuojama deklaruoti

PPP turi būti aktualus
Esant pasikeitimams, turi būti
atnaujinamas

PPP pildymas. Išlaidų skirstymas

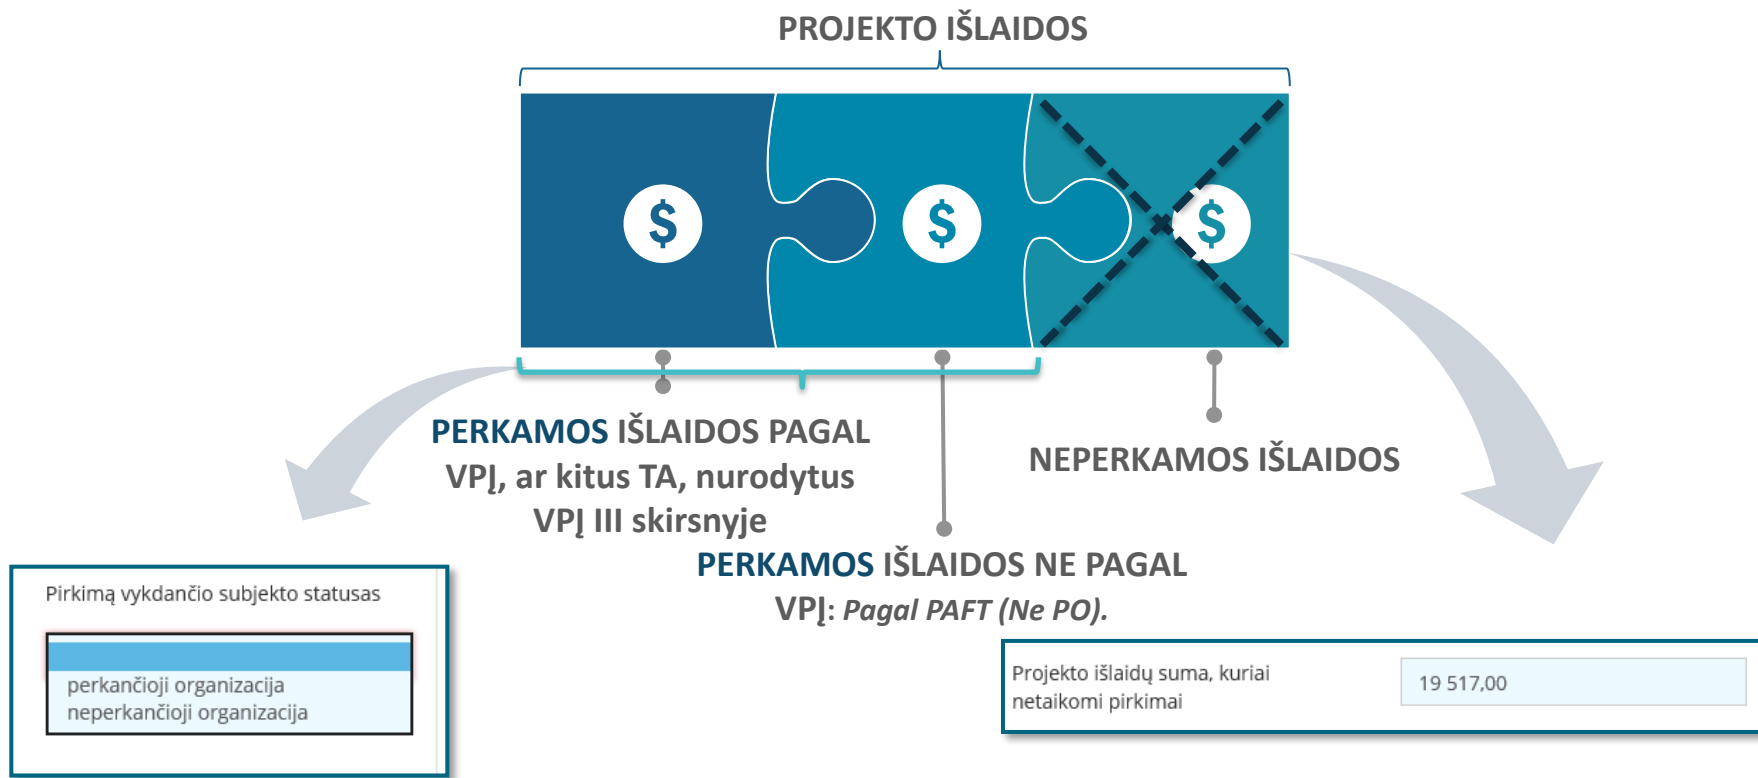

Išlaidos, kurioms netaikomi pirkimai



FIKSUOTA NORMA

Projekto sutarties 2 priede „Finansavimo sąlygos“

1.4.2. Fiksuotoji norma

Priemonės Nr.	Fiksuotosios normos tipas	Fiksuotosios normos kodas	Fiksuotosios normos pavadinimas	Taikoma fiksuotoji norma (procentais)	Netiesioginėms išlaidoms teikiami pagrindžiantys dokumentai	Pastabos
05.4.1-CPVA-V-301	Standartinė fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms	FN-002		1.82	<input type="checkbox"/>	
05.4.1-CPVA-V-301	Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma	FN-001		10.5		

Įtraukiama suma, jeigu pagrindžiantys dokumentai **neteikiami**.



FIKSUOTI ĮKAINIAI

Projekto sutarties 2 priede „Finansavimo sąlygos“

1.4.3.

Nr.	Fizinio rodiklio numeris	Pavadinimas	Dydis, eurai	Rezultato mato vienetas	Planuojamas vienetų kiekis	Rezultato pasiekimą įrodantys dokumentai	Pastabos
Fiksuotieji įkainiai (pavyzdžiui, kuro įkainiai)							



DARBO UŽMOKESTIS



RINKLIAVOS

PPP pildymo būdai

Pdf forma gali būti naudojama iki pirmo įkėlimo į DMS. Vėliau PPP duomenys tikslinami ir keičiami tik tiesiogiai DMS!

Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS

Duomenų mainų svetainė VIRGINIJA LEVINSKIENĖ Atsijungti

Paraiška ir sutartis ▾ Mokėjimai ir grąžinimai ▾ Pirkimai ▾ Patikrinimai ▾ Pranešimai Naudotojai

🏠 > Pirkimai > Teikiami duomenys > Teikiamas pirkimų planas Svarbi informacija

PPP	Pranešimai	Dokumentai
		ĮKELTI PPP

Bendra informacija Pirkimų sąrašas

PIRKIMŲ DUOMENYS

[+PRIDĖTI PIRKIMO DUOMENIS](#)

Atsijungiantis

Parsisiuntus PDF formą, kurią užpildžius importuojama į DMS

PLANUI PRITARTA
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. spalio 23 d. protokolu Nr. 22 Pirkimų priežiūros proceso priedas

PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAS

Data ?

IS Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) vykdytojo rekvizitai:

Pavadinimas: ? Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Juridinio asmens kodas: ? 173224274

Projekto duomenys:

Pavadinimas: ? VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastato pritaikymas neigaliesiems

Kodas: ? 08.1.3-CPVA-V-607-02-0004

Projekto išlaidų suma: ? 115.160,88

Planuojamų projekto pirkimų suma, finansuojama projekto lėšomis: ?

Įvykdytų pirkimų linkamų finansuoti išlaidų suma: ?

Projekto išlaidų suma, kuriai netaikomi pirkimai: ?

Pastabos ?

IS viso: ?

... vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

PPP pildymas tiesiogiai per DMS

Duomenų mainų svetainė

VIRGINIJA LEVINSKIENĖ



Atsijungti

Paraiška ir sutartis

Mokėjimai ir grąžinimai

Pirkimai

Patikrinimai

Pranešimai

Naudotojai

Home > Pirkimai > Teikiami duomenys > Teikiamas pirkimų planas

Duomenų peržiūra

Teikiami duomenys

Svarbi informacija

Teikiamas pirkimų planas

Teikiamos pirkimų sutartys

Teikiamas PPP

Žurnalas

UŽSAKYTI PRELIMINARŲ PPP

Gauta 2020-12-29 16:09



PILDYTI PIRKIMŲ PLANĄ

Eilės nr.	Pateikimo data	Data	Planuojamų projekto pirkimų suma	Vykdomų pirkimų išlaidų suma	Ivykdytų pirkimų tinkamų finansuoti išlaidų suma	Projekto biudžeto suma, kuriai netaikomi pirkimai	Iš viso	Būsena	Būsenos data
-----------	----------------	------	----------------------------------	------------------------------	--	---	---------	--------	--------------

PPP pildymas tiesiogiai per DMS

Paraiška ir sutartis ▾

Mokėjimai ir grąžinimai ▾

Pirkimai ▾

Patikrinimai ▾

Pranešimai

Naudotojai

🏠 > Pirkimai > Teikiami duomenys > Teikiamas pirkimų planas

Svarbi informacija ⓘ

PPP

1. Automatiškai apskaičiuoja užpildžius PPP „Pirkimų sąrašas“

2. Įrašyti sumą, kuriai netaikomi pirkimai

3. Būtina pakomentuoti kas sudaro išlaidų sumą, kuriai netaikomi pirkimai

Bendra informacija | Pirkimų sąrašas

Projekto išlaidų suma: 281 029,00 EUR

Projekto išlaidų suma, kuriai netaikomi pirkimai: * 3 057,00 EUR

Planuojamų projekto pirkimų suma: 277 972,00 EUR

Iš viso: 281 029,00 EUR

Vykdomų pirkimų išlaidų suma: 0,00 EUR

Sutaupymai: 0,00 EUR

Įvykdytų pirkimų tinkamų finansuoti išlaidų suma: 0,00 EUR

Pastabos:

Projekto suma, kuriai netaikomi pirkimai, si

3. Būtina pakomentuoti kas sudaro išlaidų sumą, kuriai netaikomi pirkimai

ĮKELTŲ RINKMENŲ SĄRAŠAS

Eilės nr.	Data	Įkėlimo laikas	Tipas *	Pavadinimas *	Aprašymas	Dydis
-----------	------	----------------	---------	---------------	-----------	-------

PPP pildymas

🏠 > Pirkimai > Teikiami duomenys > Teikiamas pirkimų planas

Svarbi informacija **i**



1. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatytas pirkimų plano pateikimo terminas, pirkimų planas teikiamas per 14 dienų po projekto sutarties sudarymo, jei ji nenustato kitaip.
2. Pirkimų planas gali būti tikslinamas arba keičiamas tik tiesiogiai prisijungus prie DMS.
3. Parsisiųstos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos XI arba DC 2015 (atsisiųsti) versijas).
4. Mokymų medžiaga projektų vykdytojams viešinama adresu: <https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS>

Uždaryti

PPP Pranešimai Dokumentai

KELTI PPP

Bendra informacija **Pirkimų sąrašas**

PIRKIMŲ DUOMENYS

+PRIDĖTI PIRKIMO DUOMENIS

Pirkimo eil. Nr.	Pirkimą vykdomasis subjektas	Pirkimo objektas	Pirkimo būdas	Planuojamas pirkimo sutarties vertė, finansuojama projekto lėšomis	Pirkimo būseną	Pirkimo būsenos data	
------------------	------------------------------	------------------	---------------	--	----------------	----------------------	--

PPP pildymas

PIRKIMO DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

Pirkimą vykdančio subjekto informacija

Eilės nr.:

1.005

Pagal įgaliojimą?:



Pirkimą vykdantis subjektas: *

Viešoji įstaiga CPO LT [30291...]

Pirkimą vykdančio subjekto kodas: *

302913276

Pirkimą vykdančio subjekto statusas: *

Perkančioji organizacija

Pirkimo informacija

Pirkimo objektas: *

Šilainių poskyris pritaikytas neįgalių

Planuojamos (-ų) pirkimo sutarties (čių) vertė be PVM: *

136 800,00 EUR

Pirkimo objekto rūšis: *

Darbai

Planuojamos (-ų) pirkimo sutarties (-čių) vertė, finansuojama projekto lėšomis: *

165 528,00 EUR

Pirkimas skaidomas į dalis:

Sudaroma preliminarioji sutartis:

Žymima, jeigu pagal VPĮ planuojama įgalioti kitą perkantįjį subjektą vykdyti pirkimo procedūras

Aprašant sukonkretinti, pvz.: X įrangos pirkimas; Y baldų pirkimas.

Jeigu perkamas mišrus objektas, nurodoma pagrindinio objekto rūšis.

Žymima, jeigu perkamas objektas skaidomas dalimis, arba bus sudaroma preliminarioji sutartis

1) Jeigu pirkimas iš kelių dalių – sumuojamos visų dalių vertės;
2) Jeigu, pildant pirminį PPP, pirkimas įvykdytas – nurodoma faktinė visa sutarties (-čių) vertė be PVM.

1) Jeigu PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis, nurodoma sutarties vertė su PVM;
2) Jeigu, **pildant pirminį PPP**, pirkimas įvykdytas – nurodoma faktinė sutarties (-čių) vertė, finansuojama projekto lėšomis.

PPP pildymas

Pirkimo objekto rūšis: * Darbai

Pirkimas skaidomas į dalis:

Pirkimo sąsaja su kitu projektu: * Ne

Pirkimo būdas: * Atviras konkursas

Pirkimo būdo pasirinkimo pagrindimas: * 2019 m. bendra to paties tipo darbų suma (BVPŽ)

Fiziniai rodikliai: * 1.1.1 Sure...

Pastabos:

CPO kataloge
esančių prekių,
paslaugų ir
darbų įsigijimas

- Atviras konkursas
- Ribotas konkursas
- Konkurencinis dialogas
- Skelbiamos derybos
- Neskelbiamos derybos
- Projekto konkursas
- Supaprastintas skelbiamas pirkimas
- Supaprastintas neskelbiamas pirkimas
- Mažos vertės pirkimas
- Pirkimas per CPO
- VPĮ netaikomas
- Inovacijų partnerystė

Tarptautinės
vertės

Supaprastintos
vertės

ATŠAUKTI

TĘSTI

PPP pildymas

Pirkimas skaidomas į dalis:

Sudaroma preliminarioji sutartis:

Pirkimo sąsaja su kitu projektu: *

Ne

Pagrindimas detalizuojamas kitoje skaidrėje.

Pirkimo būdas: *

Atviras konkursas

Pirkimo būsenos data:

2019-05-24

Pirkimo būdo pasirinkimo pagrindimas:

2019 m. bendra to paties tipo prekių (BVPŽ331) panašių pirkimų verčių suma 2433322,11 Eur be PVM viršija tarta

Fiziniai rodikliai: *

1.2.1 Įsigyta medicininė ir kita įranga ir baldai ✕

Pastabos:

Planuojamos įsigyti įrangos antro lygio fiziniai rodikliai: 1.1.1.1, 1.1.1.5, 1.1.2.6


Nurodomi I lygio fiziniai rodikliai arba 6 ir 7 biudžeto kategorija (*tu atveju kai teikiami išlaidas pagrindžiantys dokumentai*).

Gali būti keli rodikliai, jeigu vienu pirkimu įsigyjama keliems rodikliams būtinų prekių / darbų / paslaugų.

Nurodomi pirkimu įsigyjami II lygio fiziniai rodikliai ir esant poreikiui kitos pastabos

Pirkimo būdo pagrindimas


Nurodomi **VPĮ str.**, kuriais vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas
Mažos vertės atveju nurodomi ir **MVPTA** punktai

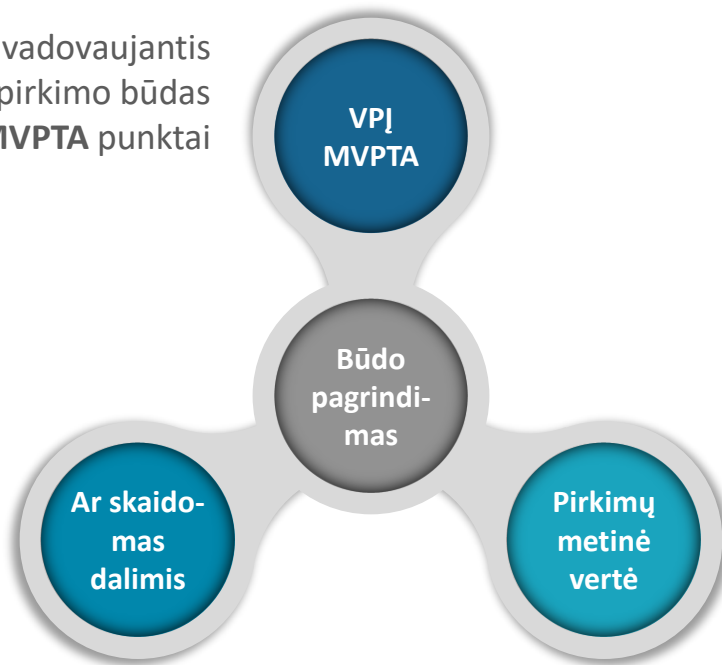

Ar pirkimas skaidomas dalimis ir kuri pirkimo dalis susijusi su projektu.

Pirkimo vertės skaičiavimas prekėms, paslaugoms, darbams, atsižvelgiant į įstaigos pirkimus, nurodant **metines vertes ir BVPŽ** kodus/veiklos rūšis

PPP keitimai atliekami kai:

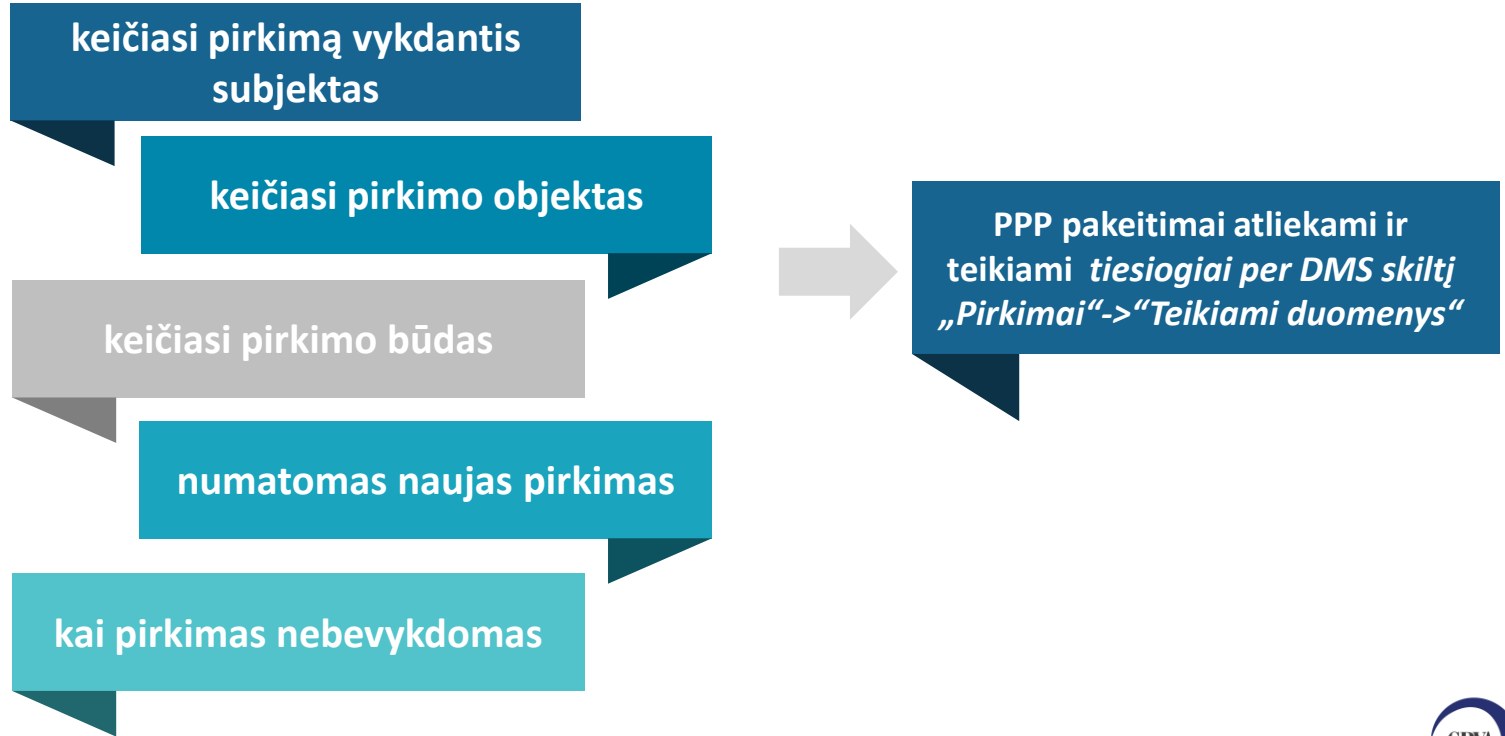


Pirkimų sutarčių duomenys

Per 14 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo arba nuo PPP patvirtinimo, per DMS pateikiama informacija apie kiekvieną sudarytą pirkimo sutartį

Kodėl to reikia?

- Nepateikus šios informacijos, nebus galima pateikti MP.
- Atnaujinama PPP informacija, kuri reikalinga projekto įgyvendinimo stebėsenai.

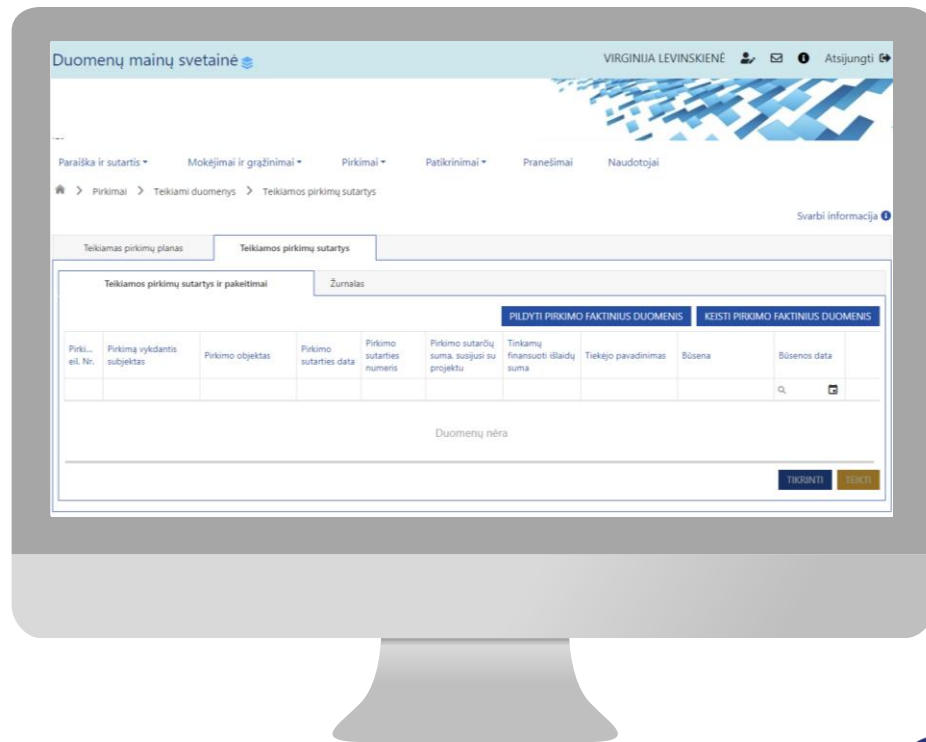

Pirkimo sutarties teikimas

Iš sąrašo pasirenkamas pirkimo Nr., kurio faktinius duomenis norima suvesti. „Pirkimą vykdantis subjektas“ ir „pirkimo objektas“ užsipildo automatiškai

Nurodoma sudarytos pirkimo sutarties informacija. Jeigu pirkimo sutartis sudaryta žodžiu, pateikiama sąskaitos faktūros informacija.

Prisegama pirkimo sutarties kopija su priedais (jeigu sudaryta žodinė sutartis, sąskaitos segti nereikia)

PIRKIMO SUTARTIES DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

Pirkimą vykdančio subjekto informacija

Pirkimo eil. Nr.: * 1.010 VšĮ Kauno miesto poliklinika ... Pirkimą vykdantis subjektas: VšĮ Kauno miesto poliklinika

Pirkimo eil. Nr.: 1.010 Pirkimo objektas: Otorinooftalmoskopai

Pirkimo sutarties informacija

Pirkimo numeris: 1542546

Pirkimo sutarties data: * 2021-01-04

Pirkimo sutarties numeris: * S-1452-ES

Žodinė sutartis:

Pirkimo sutarties įvykdymo termino pabaigos data: 2021-03-10

Sutarties pratęsimo galimybė: Ne

Pirkimo sutarties suma susijusi su projektu: * 15 000,00 EUR

Tinkamų finansuoti išlaidų suma: * 15 000,00 EUR

Fizinis(-iai) rodiklis(-iai): 1.2.1 Įsigyta medicininė ir kita įranga ir baldai

Pastabos:

Tiekėjas yra užsienio subjektas:

Fizinis/juridinis asmuo: * juridinis

Tiekėjo pavadinimas: * ? Uždaroji akcinė bendrovė "L... X

Tiekėjo gimimo data:

Tiekėjo juridinio asmens kodas: * 111497743

Pateikiama informacija apie tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis

ĮKELTŲ RINKMENŲ SĄRAŠAS

Eilės nr.	Data	Įkėlimo laikas	Tipas *	Pavadinimas *	Aprašymas	Dydis	Rinkmena
Duomenų nėra							

Pirkimo sutarties duomenų teikimas

Nurodoma pirkimo sutarties data ir numeris. Jei sutartis sudaryta žodžiu, įrašomi sąskaitos faktūros rekvizitai.

Būtina suteikti sutarčiai unikalų numerį!

Nurodoma pirkimo sutartyje numatyta prekių/paslaugų teikimo ar darbų atlikimo termino pabaigos data (neįtraukiant pratęsimo termino).

Jeigu terminas nustatytas nuo užsakymo pateikimo, nurodoma sutarties galiojimo termino pabaigos data.

Nurodoma pirkimo sutarties suma, susijusi su projektu, kuri galėtų būti pripažinta tinkama finansuoti ir neviršija projekto biudžete numatytos sumos.

Pirkimo sutarties informacija

Pirkimo numeris:	1542546	Tiekėjas yra užsė
Pirkimo sutarties data: *	2021-01-04	Fizinis/juridinis a:
Pirkimo sutarties numeris: *	S-1452-ES	
Žodinė sutartis:	<input type="checkbox"/>	
Pirkimo sutarties įvykdymo termino pabaigos data:	2021-03-10	
Sutarties pratęsimo galimybė:	Ne	
Pirkimo sutarties suma susijusi su projektu: *	15 000,00 EUR	
Tinkamų finansuoti išlaidų suma: *	15 000,00 EUR	
Fizinis(-iai) rodiklis(-iai):	1.2.1 Įsigyta medicininė ir ki	

Pastabos:

Iš sąrašo pasirenkamas I lygio fizinio rodiklio numeris, arba 6 ir 7 biudžeto kategorija. Gali būti nurodomi keli rodikliai.

Nurodomas CVP IS pirkimo numeris

Tiekėjas yra užsė


Fizinis/juridinis a:

Jeigu sutartis sudaryta žodžiu, tuomet žymime varnelę ir dalis laukų tampa neprivalomais pildyti. Taip pat bus lengvesnis MP pildymas.

Tiekėjo juridinio :

Nurodoma visa pirkimo sutarties suma, susijusi su projektu. Pvz:

1. jei pirkimo sutarties vertė viršija projekto biudžetą jai numatytą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, nurodoma visa pirkimo sutarties vertė, skirta projektui;
2. jei sudaryta pirkimo sutartis 2 projektams, nurodoma pirkimo sutarties suma, skirta tik šiam projektui.

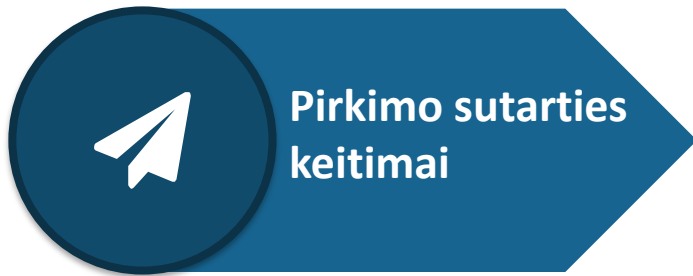

**Teikiami nedelsiant nuo susitarimo pasirašymo
per DMS skiltį
„Pirkimai“ -> „Teikiami duomenys“ ->
„Teikiamos pirkimų sutartys“**



PIRKIMO SUTARTIES DUOMENŲ KEITIMAS

Pirkimą vykdančio subjekto informacija

Pirkimo sutarties numeris: * Pirkimą vykdančias subjektas:

Pirkimo eil. Nr.:

Pirkimo sutarties informacija

Pirkimo numeris: subjektas:

Pirkimų patikros. PAFT 40 skirsnis



**IŠANKSTINĖ PIRKIMO DOKUMENTŲ
PATIKRA**



**ĮVYKDYTŲ PIRKIMŲ (PASKESNĖ)
PATIKRA**

Išankstinė pirkimo dokumentų (PD) patikra

Išankstinės pirkimų patikros tikslas – galimų pažeidimų prevencija

Atkreipiame dėmesį,
kad už **tinkamą**
pirkimų įvykdymą
atsakinga **perkančioji**
organizacija



01

Kurių pirkimų dokumentus tikriname?

Atrinktų pirkimų, apie kuriuos informuojame per DMS įvertinus PPP.

Pirkimai atrenkami atsižvelgiant į **vertę, svarbą, rizikingumą.**

02

Kada atliekama patikra?

Iki pirkimo vykdymo pradžios pirkimo dokumentai teikiami per DMS iš atitinkamo pirkimo pasirašytu el. parašu pranešimu

03

Kiek laiko vertiname PD?

PD įvertinimas atliekamas per 30 d. nuo PD gavimo dienos.

04

Kaip informuojame apie rezultatus?

DMS pranešimu pateikiamos **rekomendacijos**, jeigu jų yra. Išimtiniais atvejais prašoma PD pateikti pakartotiniam įvertinimui.

Išankstinė PD patikra ≠ įvykdytų pirkimų patikrai

Išankstinė PD patikros apimtis

Apie vertinamų pirkimų PD apimtį CPVA informuoja įvertinusi PPP per DMS



VISA APIMTIS



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



PD teikiami CPVA DMS pasirašytu el. parašu pranešimu atitinkamo pirkimo skiltyje „Pranešimai“

Pirkimo dokumentų teikimas per DMS

Duomenų mainų svetainė

VIRGINIJA LEVINSKIENĖ    Atsijungti 

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune
08.1.3-CPVA-R-609-21-0044
VšĮ Kauno miesto poliklinika, 135042394
Įgyvendinama sutartis

Paraiška ir sutartis

Mokėjimai ir grąžinimai

Pirkimai

Patikrinimai

Pranešimai

Naudotojai

🏠 > Pirkimai > Duomenų peržiūra > Pirkimų sąrašas

1 Duomenų peržiūra

Teikiami duomenys

Svarbi informacija 

Bendra pirkimų informacija

2 Pirkimų sąrašas

Pirkimų sutarčių ataskaita

PPP versijos

Pirkimas

Sutartis

4 Pranešimai

Dokumentai

Pirkimą vykdančio subjekto informacija

3. Iš pirkimų sąrašo atidaromas pirkimas, kurio dokumentus norima pateikti

1.005


Pagal įgaliojimą?

Pirkimą vykdančio subjekto kodas:

135042394

Kada pateikti PD?

Pirkimo objekto rūšis: *	Darbai	Planuojamos (-ų) pirkimo sutarties (-čių) vertė, finansuojama projekto lėšomis: *	132 759,99 EUR
Pirkimas skaidomas į dalis:	<input type="checkbox"/>	Sudaroma preliminarioji sutartis:	<input type="checkbox"/>
Pirkimo sąsaja su kitu projektu: *	Ne	Pirkimo būseną: *	Planuojamas
Pirkimo būdas: *	Supaprastintas skelbiamas ...	Pirkimo būsenos data: *	2021-04-27

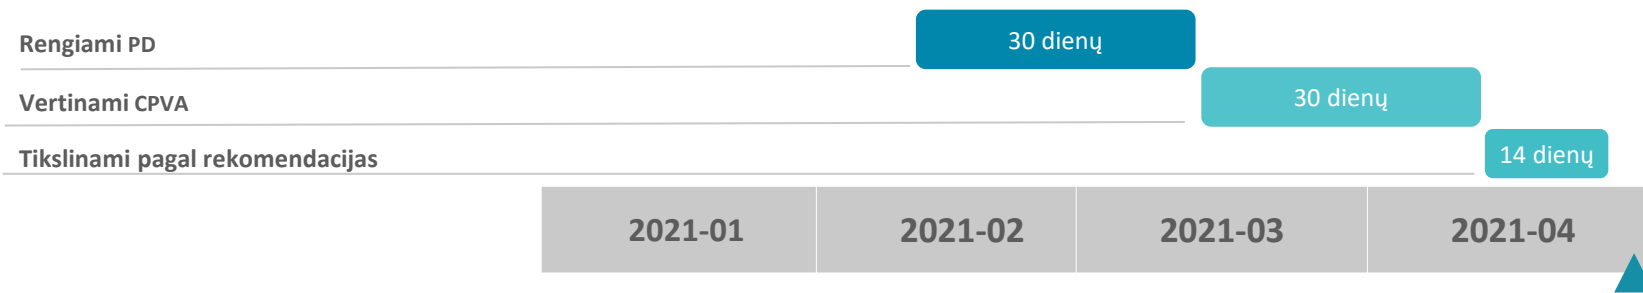

Įvykdytų pirkimų patikra

Tikslas – įvertinti ar pirkimai atlikti laikantis teisės aktų reikalavimų.



Pirkimo įvertinimas atliekamas pateikus pirkimo dokumentus (PD) **per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS)**.




Prašome PD teikti **tik tų pirkimų**, kurių prašoma pateikti DMS pranešime. Likusių pirkimų dokumentai neteikiami, nebent bus paprašyta atskiru pranešimu.



PD prašome teikti **nedelsiant po to**, kai įvykdysite pirkimą. Vėliau, pateikus su pirkimu susijusį MP, jo įvertinamas vyks greičiau.



Pirkimų įvertinimo rezultatai

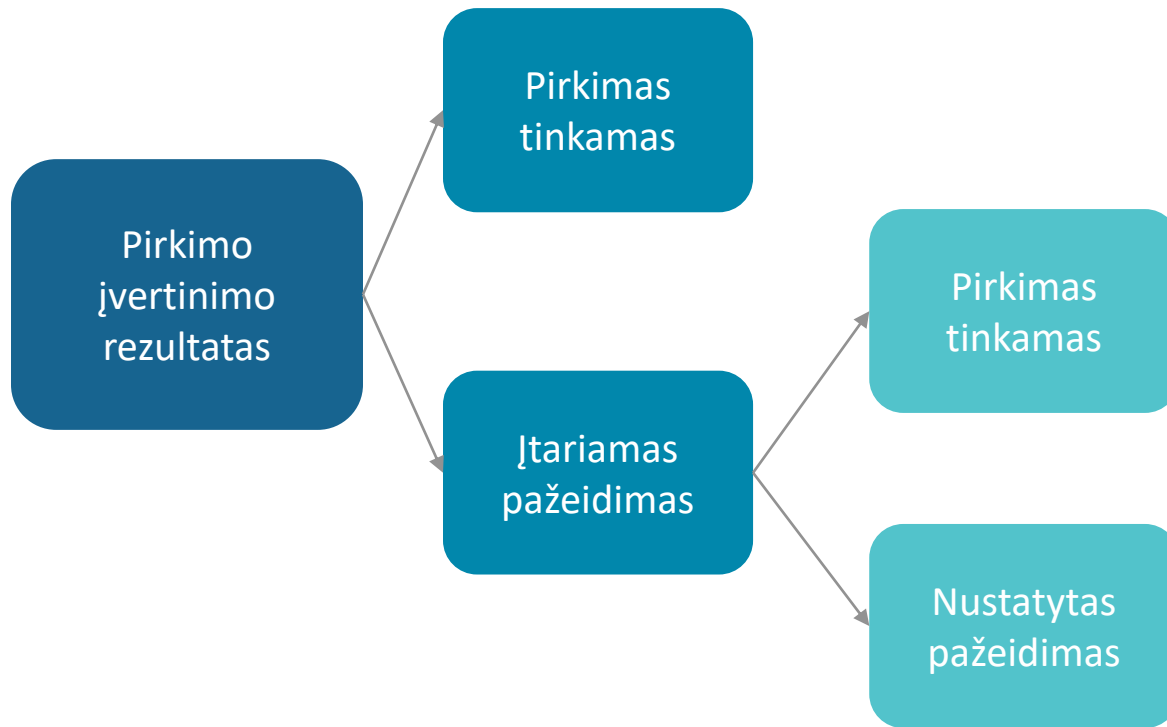

Pirkimo dokumentų teikimas per CVP IS









- ▶ **Teikiami CVP IS priemonės atlikti pirkimai ir ne CVP IS priemonėmis atlikti pirkimai** (pvz. neskelbiamos derybos)
- ▶ **Pirkimų per CPO ir Ne PO pirkimų dokumentų į CVP IS talpinti ir teikti nereikia**
- ▶ **CVP IS turi būti patalpinti visi su pirkimu susiję dokumentai** (skelbimas, protokolai, VPP ataskaita ir kt.)
- ▶ **Pirkimo vertinimas**
Esant prieštaravimui tarp CVP IS esančios informacijos ir projekto vykdytojo saugomų su pirkimu susijusių dokumentų, vertinimas atliekamas atsižvelgiant tik į CVP IS esančią informaciją




CPVA parengtą instrukciją kaip pirkimo dokumentus pateikti patikrai per CVP IS rasite čia:
www.cpva.lt → ES fondų investicijos 2014-2020 m. → Dokumentai

Pirkimo dokumentų teikimas per CVP IS

CVP IS     Administravimas  PO Pagalba  Išėiti

| pradžia / Mano pirkimai / Darbų sąrašas

Pirkimas 14662 - 000111 - Linijinis greitintuvas


 Nurodymai

Administravimas

Tiekėjai ir pasiūlymai

- » [Tiekėjų apžvalga](#)
- » [Pasiūlymai](#)


Pranešimų siuntimas

-  [Pranešimų siuntimas](#)


Eiti į užduotis

- [Eiti į užduotis](#)

Audito seka


-  [Audito seka](#)

Planuojami pirkimai


-  [Eiti į planuojamą pirkimą](#)

[Nutraukti pirkimą](#) [Kopijuoti...](#)

Darbų sąrašas

 Pirkimas - Linijinis greitintuvas

- Pirkimo būdo pasirinkimas**
Pasirinktas pirkimo šablonas: *07 Atviras konkursas*
- Tvarkyti pirkimo dalis** [Linijinis greit...](#)
Sukurti, šalinti, kopijuoti arba redaguoti šio pirkimo dalis
- Paskirti komandą** [Paskirti komandą](#)
Paskirti komandos narius darbu su šiuo pirkimu
- Nustatyti pranešimų gavėjus** [Nustatyti pranešimų gavėjus](#)
Nustatyti arba pakeisti komandos narius, kurie gali vykdyti susirašinėjimą su pirkimo dalyviais
- Pasirinkti BVPŽ kodus** [Pasirinkti BVPŽ kodus](#)
Pasirinkite BVPŽ kodus, kurie bus naudojami šiame pirkime bei pirkimo skelbime.
- Pirkimo procedūros datas** [Redaguoti](#)
Nustatyti arba keisti šio pirkimo datas
- Skelbimo vieta** [Redaguoti](#)
Nustatykite skelbimo vietą šiam pirkimui
- ES struktūrinių fondų projektai** [Redaguoti](#)
Priskirkite pirkimą ES SF projektui.

 Linijinis greitintuvas [Pasiūlymų pateikimo terminas (EET): 2015-06-08 14:00]

Per CVP IS pateikiami pirkimo dokumentai/Vidiniai dokumentai

Rekomenduojami dokumentų aplankai	Su pirkimu susiję dokumentai	CVP IS pirkimas (pvz. Atviras konkursas)	Ne CVP IS pirkimas (pvz. neskelbiamos derybos)
Pirkimo dokumentai	Skelbimas apie pirkimą*	✓	✓
	Pirkimo dokumentai, tiekėjams siųsti pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai		✓
Tiekėjų pasiūlymai	Tiekėjų paraiškos, pasiūlymai		✓
	Susirašinėjimas su tiekėjais		✓
Pirkimo procedūrų dokumentai	Paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai (protokolai)	✓	✓
	Viešojo pirkimo procedūrų (VPP) ataskaita*	✓	✓
Kiti dokumentai	VPT raštai, teismo nutartys /sprendimai/rezoliucijos ar ieškiniai teismui	✓	✓

CVP IS turi būti patalpinti **visi** su pirkimu susiję dokumentai. Lentelėje sužymėta, kokius dokumentus reikia įkelti į vidinių dokumentų aplanką.


Esant dideliame dokumentų kiekiui, prašome sukurti **dokumentų aplankus** lengvesniam dokumentų suradimui.

* Skelbimo apie pirkimą ir VPP ataskaitos skenuotas/elektronines versijas būtina įkelti prie pirkimo dokumentų, kadangi šiuo metu neužtikrinamas tinkamas viešai prieinamų duomenų saugojimo terminas



Įvykdyto pirkimo dokumentų teikimas ir tikrinimas

Veiksmų seka

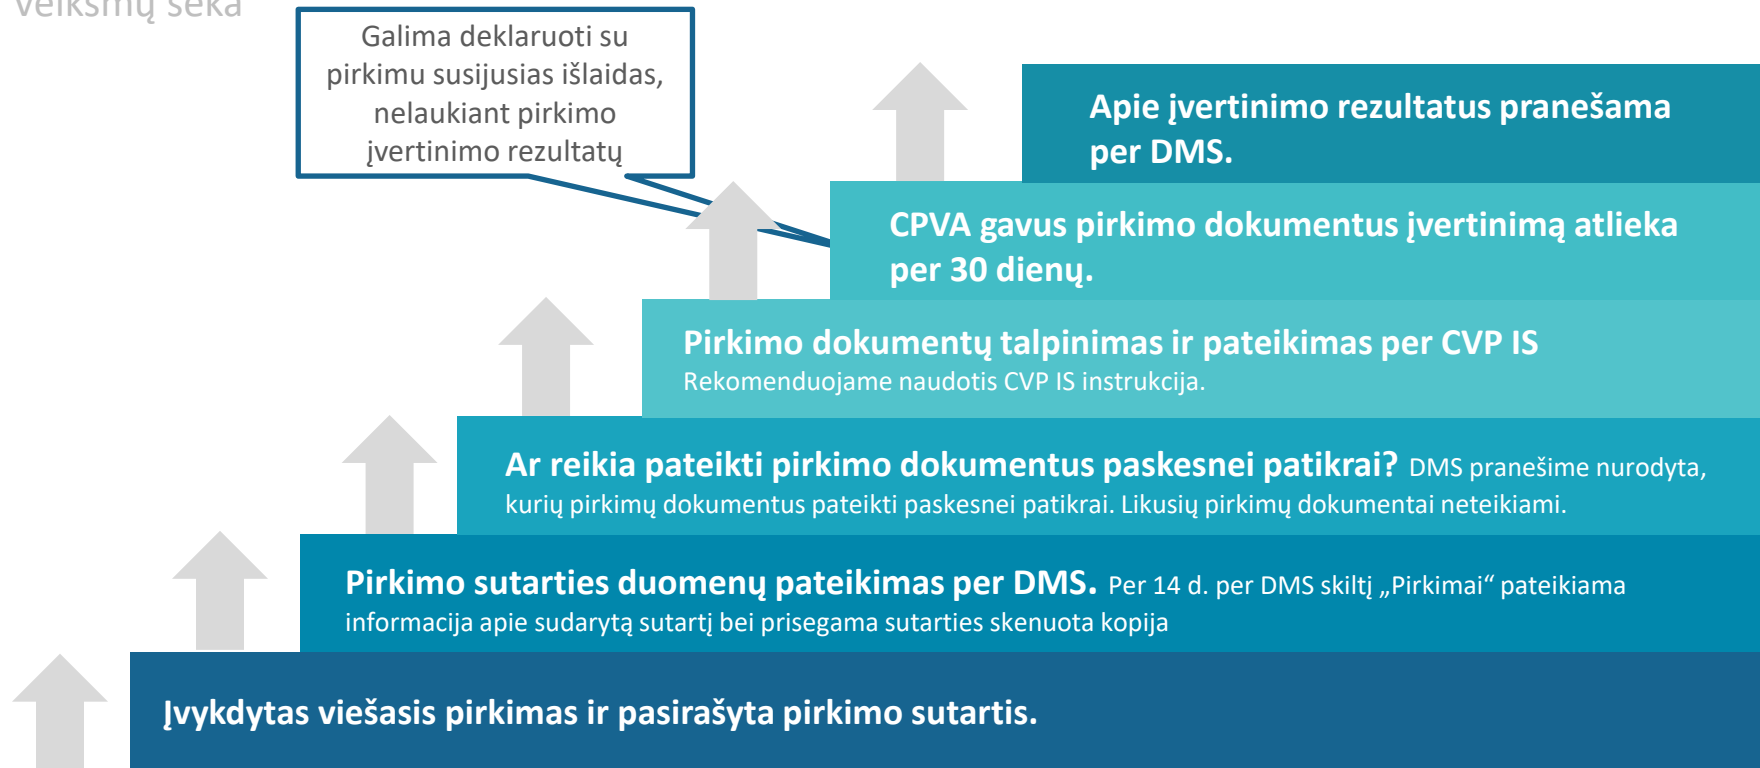



STRUKTŪRINĖS PARAMOS
PROJEKTŲ DEPARTAMENTAI



KREIPTIS Į UŽ PROJEKTĄ
ATSAKINGĄ PROJEKTO VADOVĄ



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą

